

VN U Školky - sesuv svahu



Pohled na místo sesuvu před zahájením prací

Březen 2023



Prostor po odstranění původního porostu

21.4. 2023



Stav svahu po vydatných deštích 22-23.4. 2023

24.4. 2023



První známky deformace paty svahu

11.5. 2023



Stav svahu po druhé vlně vydatných dešťů 15-16.5. 2023

17.5. 2023



Celkový pohled na plochu sesuvu

17.5. 2023



Pohyb svahu v horní části mimo území dotčeného stavbou

24.5. 2023



Pohled na vytvořené trhliny v horní části svahu

24.5. 2023



Současný stav sesuvu

24.7. 2023


IGP

**Chybné posouzení lokality z
hlediska evidence území v oblasti
aktivního sesuvu.**

2.5 ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU, STŘETY ZÁJMŮ

Zájmová oblast není součástí CHKO (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a dále není součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV. Zájmová lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění).

Lokalita neleží v záplavovém území. Zájmová lokalita není v databázi ČGS – GEOFONDU evidována jako plocha sesuvu. Lokalita se nenachází v CHLÚ.

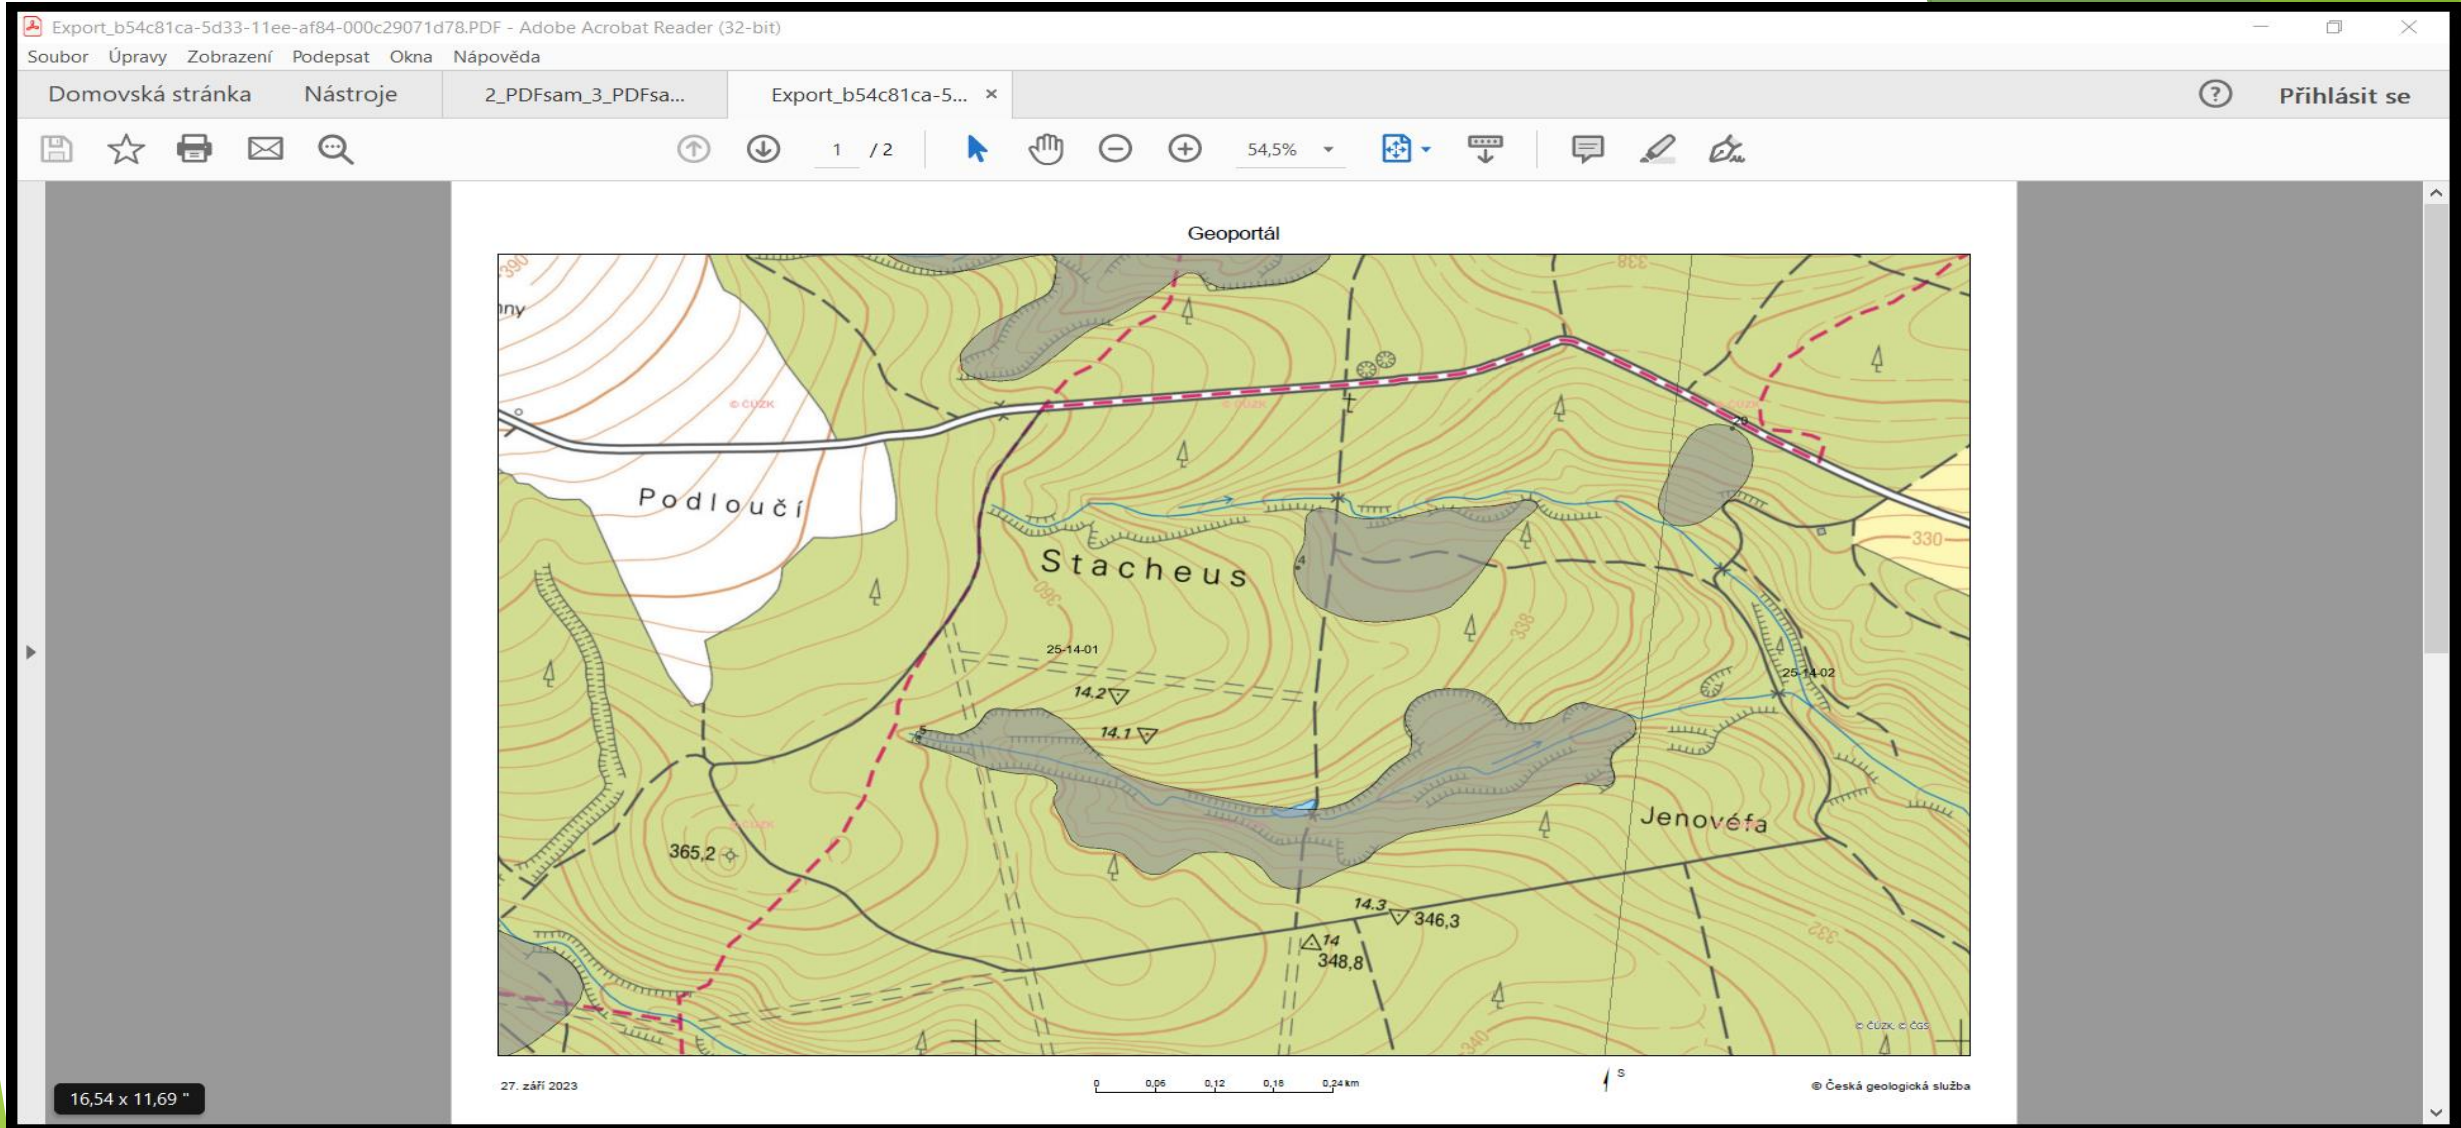

Snímek z portálu České geologické služby - evidovaný sesuv v místě stavby

Způsob řešení

- 1) Práce na stavbě byly přerušeny.
- 2) Zhotovitel provedl terénní úpravy tak, aby bylo staveniště bezpečné.
- 3) Byla oslovena specializovaná geologická firma (Geotest Brno) pro zpracování návrhů řešení, jak sesuv sanovat.
- 4) Na základě posouzení několika návrhů řešení byl vybrán ekonomicky nejvýhodnější způsob.
- 5) Projektant zpracoval nový návrh technického řešení včetně návrhu rozpočtu.
- 6) Bude vypracován Změnový list a Dodatek k SoD. Na základě těchto podkladů budou práce opět povoleny a zhotovitel dokončí práce na stavbě.
